

# KCCD Servicios de Planificación de Construcción 2012 – 13

(Sin auditar)

**4to Trimestre**  
**Termina 30 de Junio 2013**

# Informática


- **Distrito SRID Gasto (MG100) por:**
  - **Resumen**
  - **Por Colegio**
  - **Por Sitio**
- **Descripción del Programa del Distrito**
  - **Construcción**
  - **Diseño**
  - **Planificación/ Administración y Investigación**

# District SRID Gastos Hasta 2012-13 4<sup>to</sup> Trimestre Junio 2013 Resumen

■ Presupuesto Inicial de la Medida G:	\$ 180,000,000
■ Intereses & Otros Ingresos:	\$ 22,113,494
■ Total de Fondos Disponibles:	\$ 202,113,495
■ Total de Fondos Usados Hasta la Fecha:	\$ 111,435,327
■ Total de Fondos Disponibles para el uso:	\$ 90,678,167

FY 12/13 Cuentas aún no auditadas

# Distrito SRID Gastos Hasta 2012-13 4to Trimestre Junio 2013

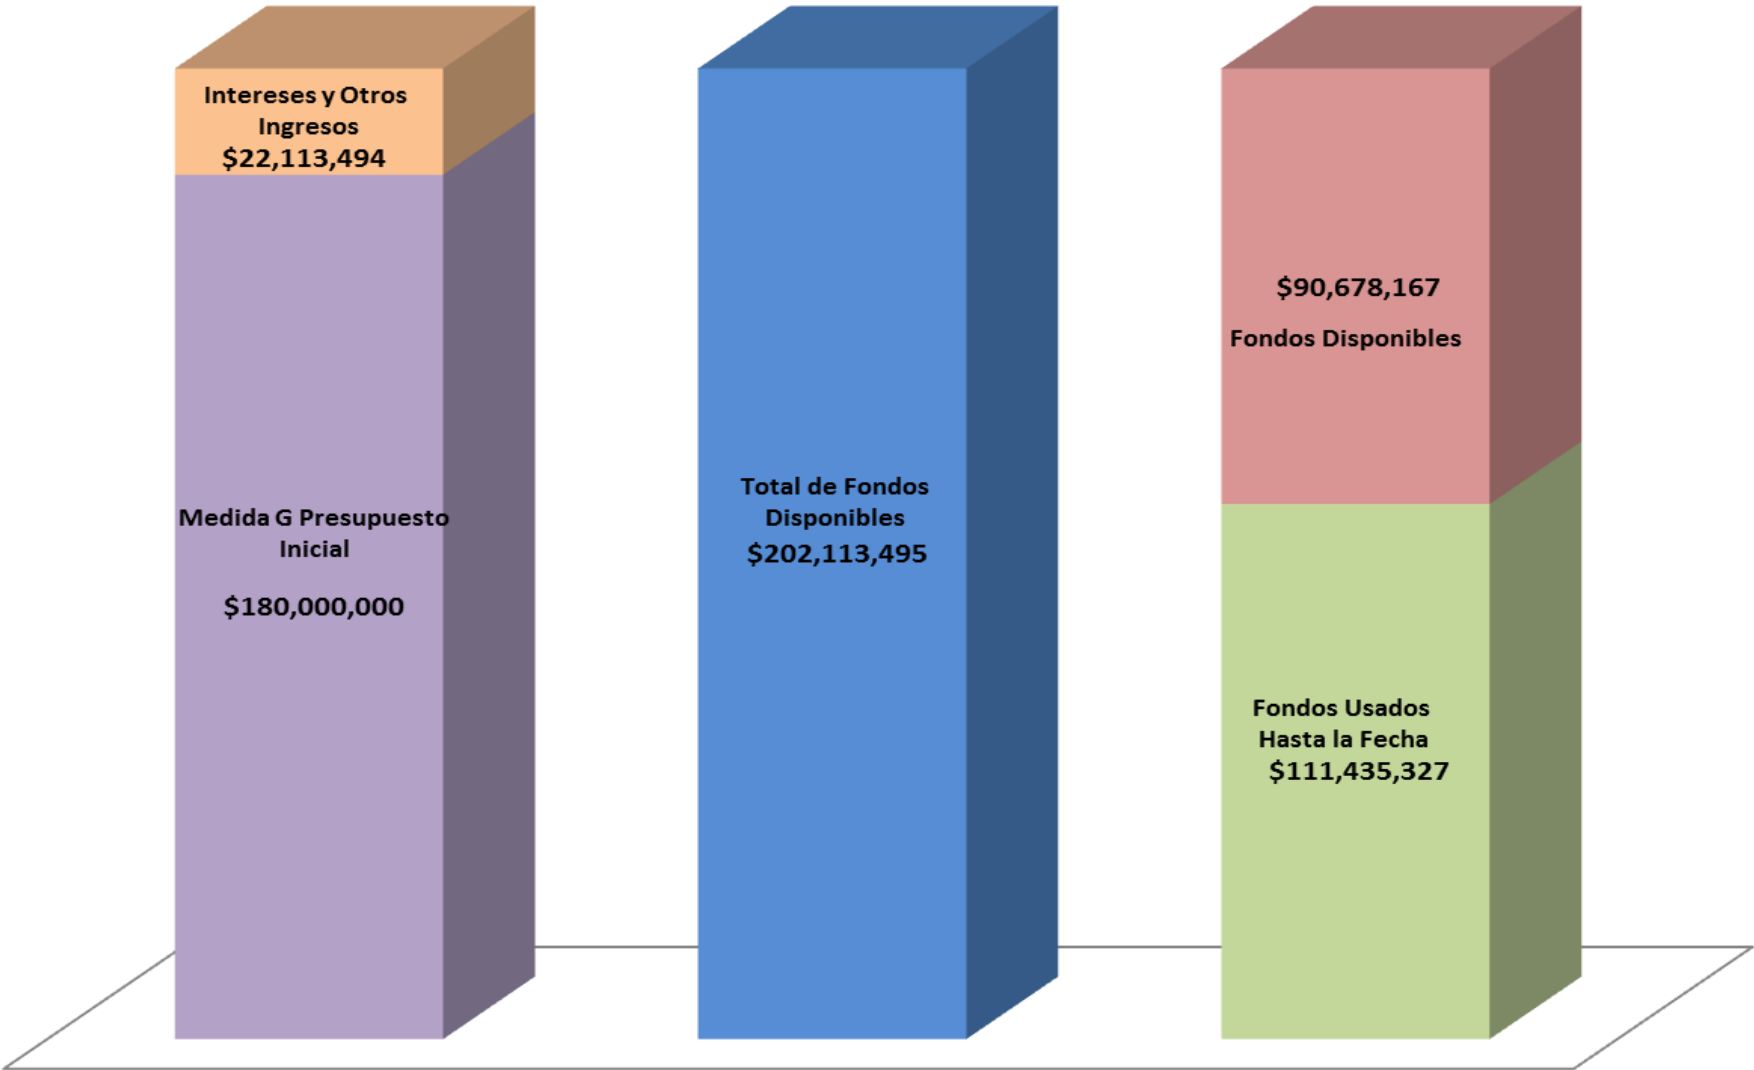


Medida G Presupuesto Inicial / Intereses y Otros Ingresos

Total de Fondos Disponibles


Fondos Usados Hasta la Fecha y el Balance Restante para su Uso

# Distrito SRID Gastos Hasta 2012-13 4to Trimestre Junio 2013

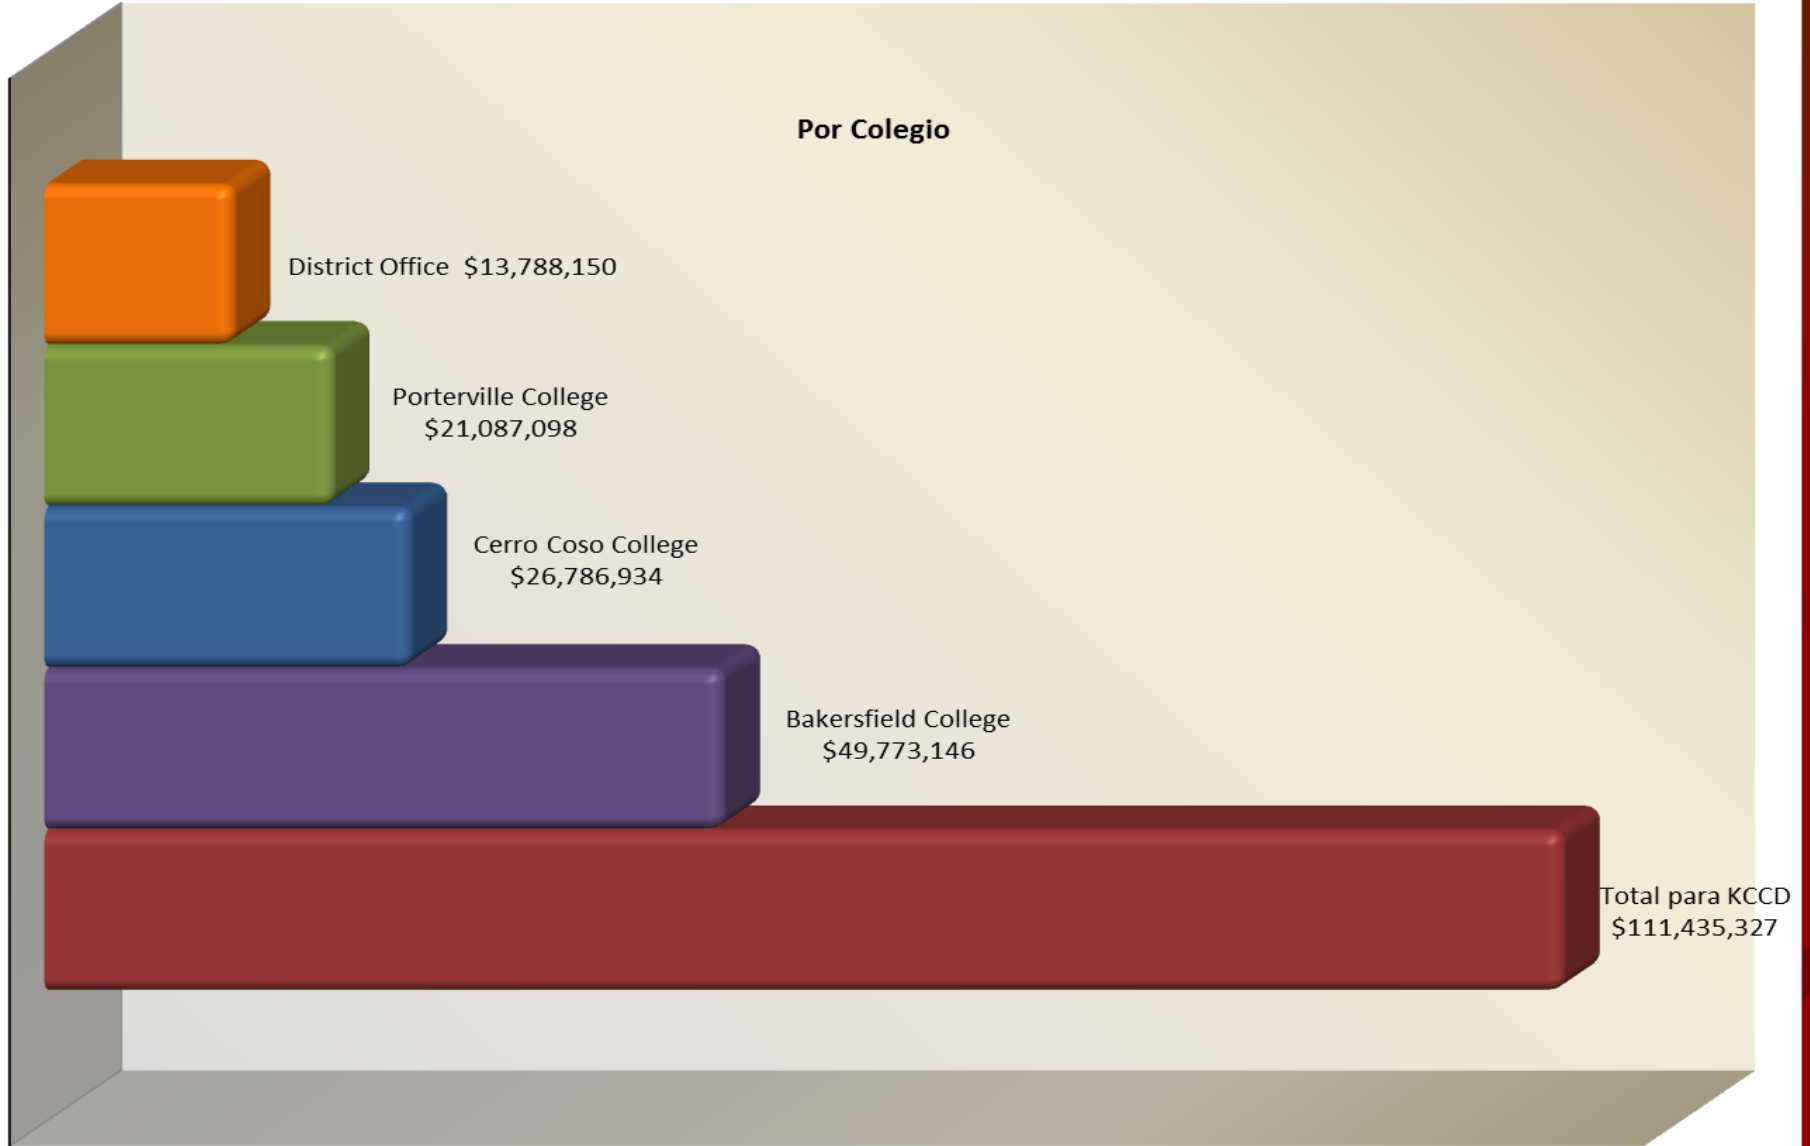


Por Sitio


### Bakersfield College

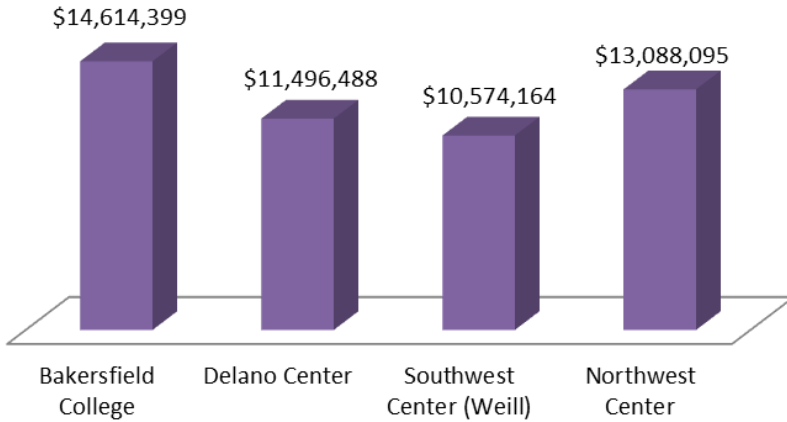


### Cerro Coso College

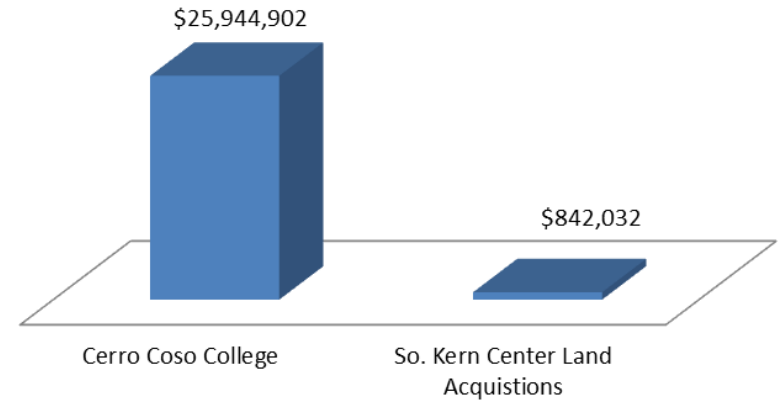

### Porterville College

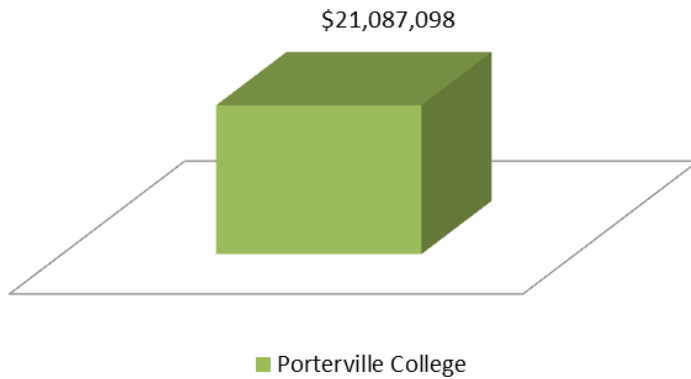

### Operaciones del Distrito

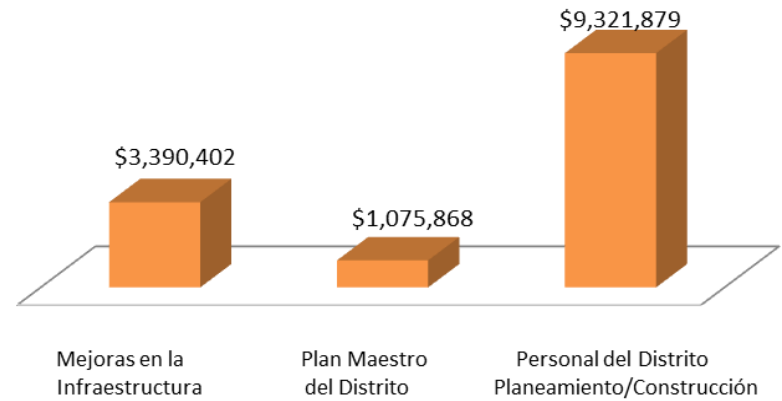

# Descripción General del Programa del Distrito

## Construcción 4<sup>to</sup> Trimestre Junio 2013

No.	Actualmente en Fase de Construcción				Construcción		Comentarios
		Presupuesto	Gastado Hasta la Fecha	Fuente de Financiación de Proyectos	% Construcción Completado	Cambio de Orden %	Descripción
	Bakerfield College						
1	Reemplazo Puerta de Entrada Edificio de Administración	\$ 29,715	\$ 19,945	SRID	99%	0.00%	Liquidación en curso
2	Club de Béisbol Conducto Teléfono/Fibra	\$ 61,737	\$ 45,000	SRID	99%	0.00%	Liquidación en curso
3	Librería Barnes & Noble	\$ 260,000	-0-	B & N	90%	0.00%	Contrato de arrendamiento
4	Educación de Negocios Proyectos de Verano	\$ 165,000	\$ 60,965	SRID/Campus	50%	0.00%	
5	Línea del Agua y Gas del Campus (Fase 1 & 2)	\$ 3,920,200	\$ 218,944	SRID	10%	0.00%	
6	Reemplazo de la Planta Enfriadora Central	\$ 2,063,830	\$ 262,052	SRID	7%	0.00%	Equipo adquirido
8	Edificio FACE Proyectos de Verano	\$ 82,000	\$ 40,196	SRID/Campus	90%	0.00%	
9	Bellas Artes Proyectos de Verano	\$ 201,000	\$ 13,144	SRID/Campus	7%	0.00%	
10	Facilidad GET	\$ 1,229,912	\$ 22,213	GET/Campus	99%	N/A	Financiado Principalmente GET
11	Edificio Artes del Lenguaje Reemplazo Puerta de Entrada	\$ 57,925	-0-	SRID	0%	0.00%	
12	Matemáticas y Cinecias Reparaciones del Techo	\$ 18,993	\$ 16,863	SRID/Campus	99%	0.00%	Liquidación en curso
13	Modernización de las Artes Escénicas (SAM)	\$ 15,895,640	\$ 2,616,532	SRID/State	7%	0.00%	
14	Foto voltaico	\$ 9,292,500	\$ 8,494,088	CEG/ Lease Rev Bonds/Campus	99%	2.49%	Liquidación en curso
15	Reparaciones del Techo de Ciencia y Ingeniería	\$ 593,800	\$ 268,326	SRID/Campus	30%	0.00%	
16	Ciencia y Ingeniería Proyectos de Verano	\$ 175,000	\$ 93,724	SRID/Campus	45%	0.00%	
17	Edificio Servicios Estudiantiles Reemplazo Puerta de Entrada	\$ 88,637	-0-	SRID	0%	0.00%	
18	Sistema de Energía Térmica Fase 2	\$ 688,224	\$ 596,885	Campus	99%	0.64%	Puesta en marcha en proceso
	Centro Weill						
19	NORAD HVAC Actualizaciones	\$ 356,800	\$343,717	SRID	99%	6.15%	Liquidación en curso
	Porterville College						
20	Bellas Artes Reemplazo de Climatización	\$ 78,900	\$33,364	SRID/Campus	99%	0.00%	Liquidación en curso
21	Línea de Incendio y Estacionamiento	\$ 562,119	\$76,380	SRID/Campus	35%	0.00%	
22	Reemplazo de Tanque Calentador del Gimnasio	\$ 24,600	\$ 500	SRID/Campus	60%	0.00%	Liquidación en curso
23	Matemáticas Ciencias Climatización, Calderas, Calentadores de Agua, Bombas	\$ 974,548	\$ 522,790	SRID/Campus	22%	0.00%	
24	Centro de Estudiantes Techado	\$ 855,359	\$ 549,275	SRID/Campus	8%	0.00%	
25	Prinipales Modificaciones Eléctricas Campus	\$ 517,500	\$ 46,227	SRID	99%	0.00%	Alcanse Reducción

# Descripción General del Programa del Distrito

## Diseño 4<sup>to</sup> Trimestre Junio 2013

No.	Actualmente en Fase de Diseño	Presupuesto			Diseño		Comentarios
		Presupuesto	Gastado Hasta la Fecha	Fuente de Financiación de Proyectos	% Diseño Completo	Autorización de Trabajo Revisado %	
<b>Bakersfield College</b>							
1	Artes Escénicas Mejoras del Lado Este	\$ 1,303,872	\$ 41,612	SRID	50%	0%	
2	Estructura de Sombra de Estacionamiento Noreste	\$ 365,453	\$ 3,259	SRID	95%	0%	DSA Revisar
3	Reparar y Reemplazar Ascensores	\$ 353,873	\$ 106,393	SRID	55%	5%	
4	Artes del Lenguaje Sótano a Prueba de Fuego	\$ 62,000	-0-	SRID/Campus	0%	0%	
<b>Centro Delano</b>							
5	Certificación de Alarma Contra Incendios de DSA	\$ 26,044	\$ 6,235	Campus	80%	0%	
<b>Centro Weill</b>							
6	Estacionamiento Actualizaciones	\$ 190,900	\$ 24,889	Other	95%	0%	DSA Revisar
7	KCCD Planificación de la Seguridad - Sólo Weill	\$ 25,846	\$ 25,846	SRID	100%	0%	
<b>Cerro Coso College</b>							
8	Modernización del Edificio Principal	\$ 15,354,088	\$ 223,926	SRID	15%	0%	Desarrollo del Diseño
9	Campus Amplia Integración de Alarma de Incendio	\$ 131,055	\$ 14,915	SRID	53%	0%	
10	Reemplazo de Climatización del Gimnasio	\$ 840,900	\$ 68,353	SRID/Campus	75%	4.7%	
11	Trabajo de Laboratorio Techado/Climatización/Soldadura	\$ 1,287,041	\$ 86,899	SRID/Campus	95%	0%	DSA Revisar
12	Ocupación y Señalización de Evacuación	\$ 84,020	\$ 27,203	Campus	90%	0%	
<b>Mammoth</b>							
13	Signo Monumento	\$ 87,765	-0-	Otros	60%	0%	
<b>Porterville College</b>							
14	Reemplazo de Techado & Climatización del Gimnasio	\$ 2,818,325	\$ 62,234	SRID/Campus	20%	0%	
15	Ruta de Viaje - la Calle Principal	\$ 126,400	\$ 14,811	SRID	73%	0%	
16	Planta Central y Lazo Enfriador	\$ 1,300,000	\$ 24,080	SRID	40%	0%	
17	Plan de Asfalto Carriles de Incendios (Plano a principal)	\$ 363,400	-0-	SRID/Campus	0%	0%	
<b>Actualmente en fase de planificación y estudios</b>							
		Presupuesto			Diseño		Comentarios
		Coste previsto	Gastado Hasta la Fecha	Fuente de Financiación	% Completo		
1	Planes de Transición	\$ 130,000	\$ 114,520		100%		
2	Normas de Construcción	\$ 110,000	\$ 88,514		80%		En el Examen Final Interno
3	CEQA	\$ 100,000	-0-		0%		



## Descripción General del Programa del Distrito

### Planificación 4<sup>to</sup> Trimestre Junio 2013

No.	Desembolso de Capital Prevista /Fondos Estatales y Locales	Presupuesto			Comentarios
		Estado \$	Local \$	Total	
	<b>Propuestas Finales de Proyectos (FPPs)</b>				FPP Aprobado
1	BC Servicios de Estudiante Modernización	\$ 19,052,000	\$ 3,333,000	\$ 22,385,000	Si
2	DC LRC Edificio Multiusos	\$ 28,385,000	\$ 4,576,000	\$ 32,961,000	Si
3	PC Establecimiento de Salud Aliados	\$ 10,925,000	\$ 5,067,000	\$ 15,992,000	Si
4	BC Artes del Lenguaje Remodelación de la Eficiencia	\$ 7,921,000	\$ 4,414,000	\$ 12,335,000	Pendiente/ Dec '13
	<b>Initial Project Proposals (IPPs)</b>				IPP Presentado
5	BC Bellas Artes Remodelación de la Eficiencia	\$ 12,127,000	\$ 2,800,000	\$ 14,927,000	Si
6	BC Ciencia y Ingeniería Reemplazo	\$ 30,242,000	\$ 14,500,000	\$ 44,742,000	Si
7	PC Carreras Tecnológicas Edificio	\$ 7,983,120	\$ 7,983,120	\$ 15,966,240	Si
8	PC Rendimiento Humano y Kinsiology	\$ 5,059,000	\$ 5,058,000	\$ 10,117,000	Si

### District Administrative & Research 4<sup>th</sup> Qtr. June 2013

No.	Actividades administrativas y de investigación	Descripción
1	Contabilidad y Informes (CM14 and P6)	La Integración de los Sistemas
2	Directrices de Diseño	
3	Gestión de Documentos	Planos/Archivos de Proyecto
4	DSA Certificación de Edificios	
5	Ahorro de Energía, Gestión de Energía, Generación de Energía	De Trabajo con CCC/IOU Favor de la Prop 39 Proyectos
6	Sistemas de Alarma Contra Incendios	
7	Plan Quinquenal Instalaciones	
8	Desarrollo de Sitios Web Informativos	Ayudando al Departamento IT
9	Notificación de Seguridad Masivo	Ayudando al Departamento IT
10	Asignación de Utilidades	

# Actividades de Comité de Supervisión de Medida G

## Conclusión:

El Comité de Supervision encuentra al Distrito que Cumple con los Requisitos del Artículo XIIA, Sección 1(b)(3) de la Constitución de California.

# Preguntas
